




# Vilniaus regiono projektų įgyvendinimas


Inga Moisiejtė, CPVA Struktūrinės paramos  
departamento direktoriaus pavaduotoja  
Justina Jakštienė, CPVA Struktūrinės paramos  
departamento Socialio apsaugos projektų skyrius

## CPVA administruojamos priemonės Vilniaus regione

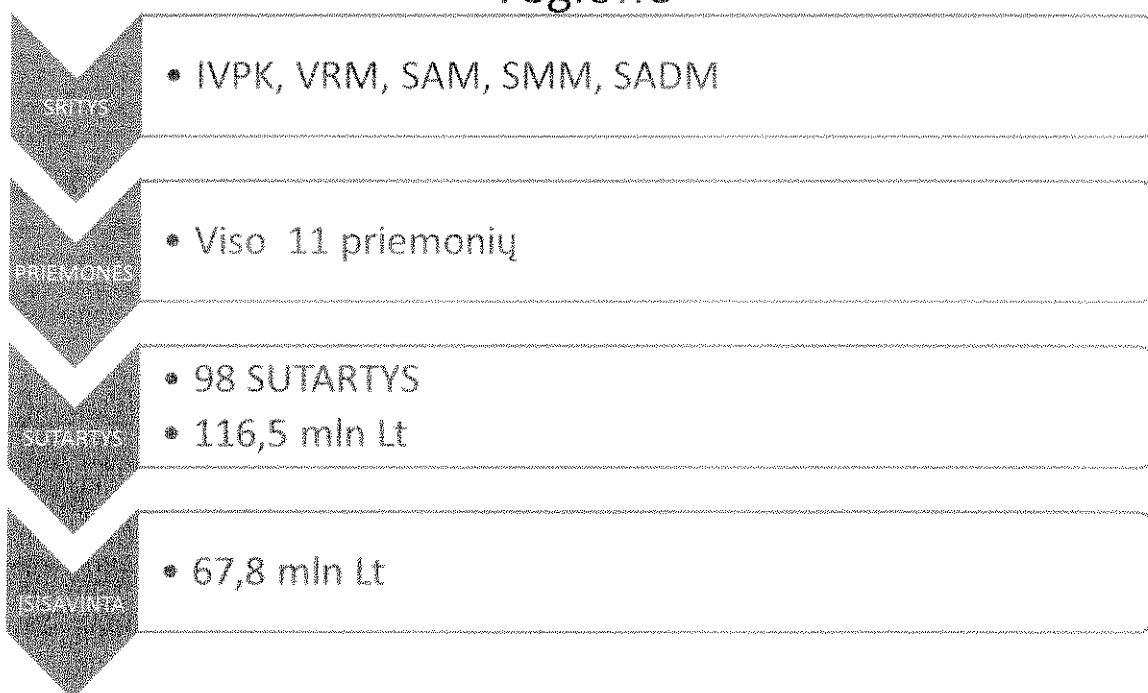

## Elektroninė demokratija: regionai VP2-3.1-IVPK-05-R

✔ Sudarytos 8 sutartys. Visos baigtos

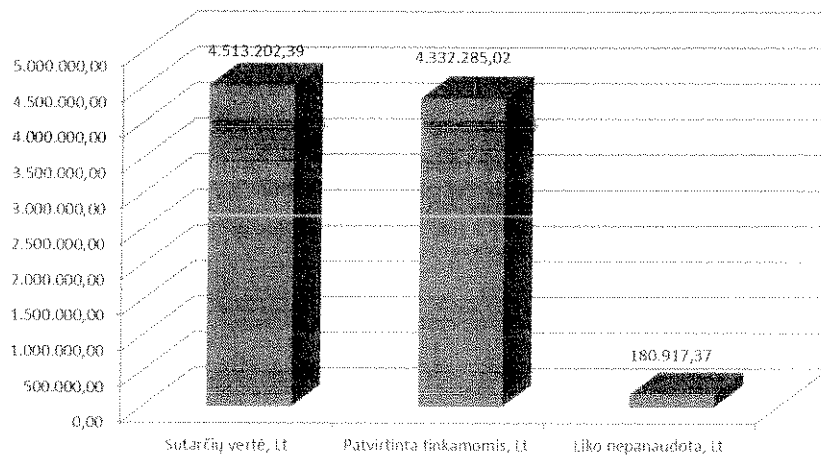


## VRM PRIEMONĖS VILNIAUS REGIONE

✔ Sudarytos 26 sutartys. 8 baigtos

✔ Ąsisavinimo sparta pagal sutartis 60 proc.


- VP3-1.2-VRM-01-R Prietaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymo
- VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas
- VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas privalusia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą
- VP3-1.1-VRM-02-R Probleminių teritorijų plėtra

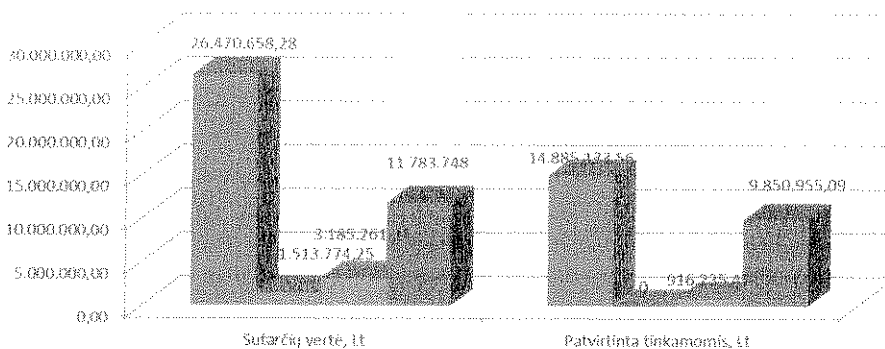

## SAM PRIEMONĖS VILNIAUS REGIONE

- ✓ Sudarytos 11 sutarėiø. 4 baigtos.
- ✓ Ásisavinimo sparta pagal sutartis 65 proc.


- VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
- VP3-2.1-SAM-09-R Krizių intervencijos centrų įkūrimas
- VP3-2.1-SAM-08-R Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

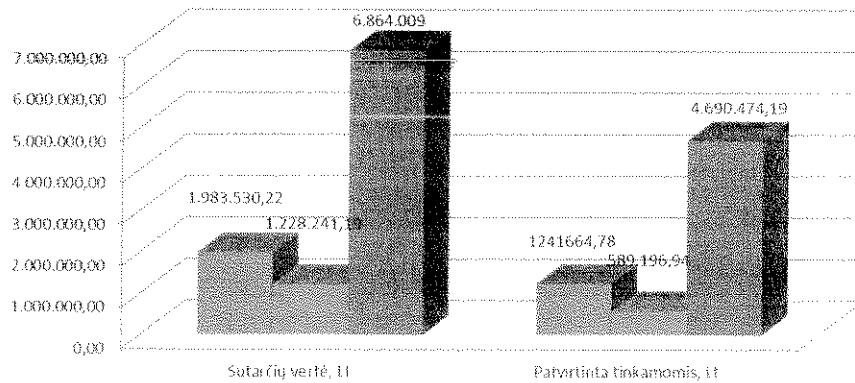

## ŠMM PRIEMONĖS VILNIAUS REGIONE

- ✓ Sudarytos 38 sutartys. 29 baigtos.
- ✓ Ásisavinimo sparta pagal sutartis 63 proc.


- VP3-2.2-ŠMM-05-R Investicijos į kilmokyklinio ugdymo įstaigas
- VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse įkūrimas

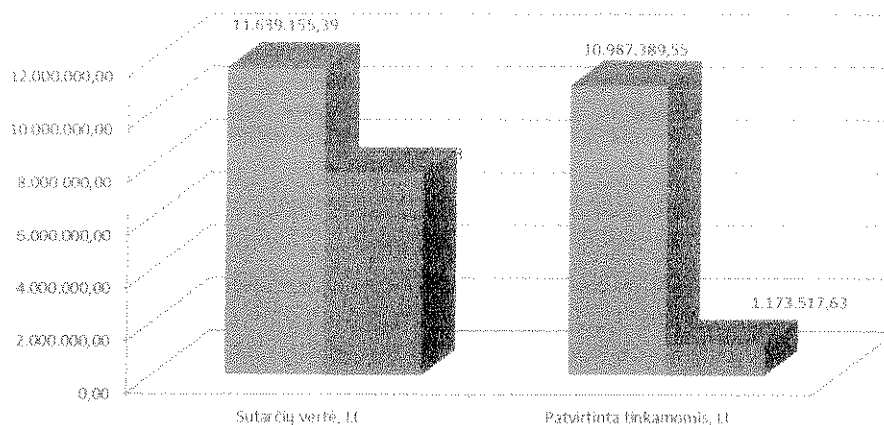

## SADM PRIEMONĖS VILNIAUS REGIONE

- ✓ Sudarytos 15 sutartys. 2 baigtos.
- ✓ Ąsisavinimo sparta pagal sutartis 48 proc.

VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

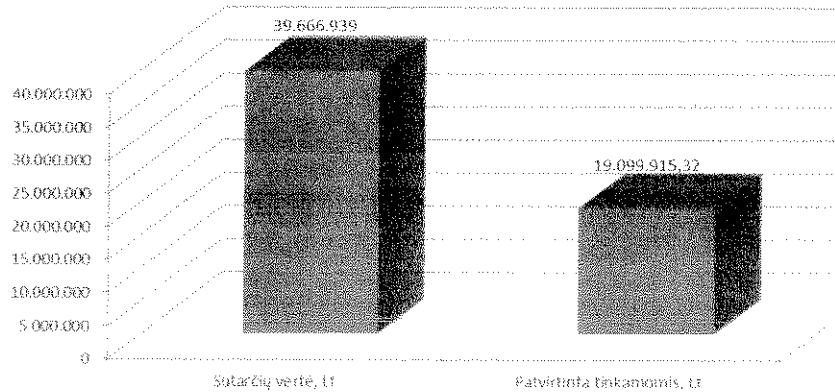

## Probleminės projektø ágyvendinimo sritys

PROJEKTO VEIKLŲ VĖLAVIMAS



NEATITIKTYS RANGOS DARBŲ VYKDYME



NESKLANDUS ADMINISTRAVIMAS



## Probleminės projektø ágyvendinimo sritys

### VEIKLŲ VĖLAVIMAI

- Vėluojama pradėti pirkimus: užprogramuojamas projekto pratęsimas
- Vėluoja projektavimo darbai (rizika pažeidimams)
- Vėluoja rangos darbai (rizika pažeidimams)

## Probleminės projektø ágyvendinimo sritys

### NEATITIKTYS

- Rangos darbų keitimai – vykdomi nesilaikant pirkimo sutarties sąlygų ir pažeidžiant VPĮ.
- Trūksta dialogo tarp Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo – dėl keitimų atitikimo VPĮ.
- Savalaikiai nesikreipiama į VPT.
- Užaktuota ne tai, kas faktiškai įvykdyta.
- Nesutvarkyti techninio projekto keitimų derinimai
- Projektavimo ir Rangos darbų vėlavimas: nesiimama netesybų valdymo priemonių (delspinigiai)

## Probleminės projektø ágyvendinimo sritys

### PROJEKTO VALDYMAS

- Projekto vadovas nesprendžia projekto problemų kompleksiskai
- Administravimo funkcijos suskaidytos ir atskirtos, pasigendam "šeimininko"
- Neefektyvus problemų sprendimas: daug dalyvių, neaišku, su kuo kalbėtis



Ačiū už dėmesà
